პროექტის სტრატეგიული კალენდარული გრაფიკი

ID	დასახელება	ხანგრძლივობა	დაწყება	დასრულება
0	**2013005TPA**	**142 days**	**Tue 17-06-14**	**Wed 31-12-14**
1	**1 ფაზა A - შეფასება**	**21 days**	**Tue 17-06-14**	**Tue 15-07-14**
2	1.1 პროექტის მენეჯერ-კოორდინატორის დანიშვნა	1 day	Tue 17-06-14	Tue 17-06-14
3	**1.2 დამკვეთის მოთხოვნების იდენტიფიკაცია**	**4 days**	**Wed 18-06-14**	**Mon 23-06-14**
4	1.2.1 ფინანსური მოთხოვნები	4 days	Wed 18-06-14	Mon 23-06-14
5	1.2.2 ვადებთან დაკავშირებული მოთხოვნები	4 days	Wed 18-06-14	Mon 23-06-14
6	1.2.3 საუბარი მოცულობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები	4 days	Wed 18-06-14	Mon 23-06-14
7	**1.3 შენობის ფუნქციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები**	**16 days**	**Tue 24-06-14**	**Tue 15-07-14**
8	1.3.1 საოფისე ფართების ფუნქცია	1.5 wks	Tue 24-06-14	Thu 03-07-14
9	1.3.2 შესყიდვების მეთოდის იდენტიფიკაცია	1.5 wks	Tue 24-06-14	Thu 03-07-14
10	1.3.3 პროცედურების იდენტიფიკაცია	9 days	Tue 24-06-14	Fri 04-07-14
11	1.3.4 ორგანიზაციული სტრუქტურის განსაზღვრა	9 days	Tue 24-06-14	Fri 04-07-14
12	1.3.5 სტრატეგიული კალენდარული გრაფიკის განვითარება	9 days	Tue 24-06-14	Fri 04-07-14
13	1.3.6 ხარჯების შეფასების პირველადი ვერსიის მომზადება	9 days	Tue 24-06-14	Fri 04-07-14
14	1.3.7 ზოგადი რისკების იდენტიფიკაცია	9 days	Tue 24-06-14	Fri 04-07-14
15	1.3.8 პროექტის მოკლე აღწერილობის(პროექტის წესდების) მომზადება	4 days	Mon 07-07-14	Thu 10-07-14
16	1.3.9 პროექტის მოკლე აღწერილობის მიმიხილება	1 day	Fri 11-07-14	Fri 11-07-14
17	1.3.10 პროექტის მოკლე აღწერილობის დამოწმება	1 day	Tue 15-07-14	Tue 15-07-14
18	**2 ფაზა B - ტენდერული დაგეგმვა**	**29 days**	**Wed 16-07-14**	**Mon 25-08-14**
19	2.1 პროექტის მოკლე აღწერილობის გარდაქმნა პირველად ტენდერულ დაგეგმვად	1 wk	Wed 16-07-14	Tue 22-07-14
20	2.2 შესყიდვების სტრატეგიის პირველადი ვერსიის განვითარება	1 wk	Wed 16-07-14	Tue 22-07-14
21	2.3 შენობის ფაქტობრივი მდგომარეობის კვლევის განხორციელება	3 wks	Wed 16-07-14	Tue 05-08-14
22	2.4 საპროექტო გეგმის შერჩევა	3.4 wks	Wed 23-07-14	Thu 14-08-14
23	**2.5 შენობის პირველადი კვლევები და დათვალიერება**	**5 days**	**Fri 15-08-14**	**Thu 21-08-14**
24	2.5.1 საარქივო და სხვა ტიპის ნახაზების შესწავლა და ფაქტობრივი მდგომარეობის შეფასება	3 days	Fri 15-08-14	Tue 19-08-14
25	2.5.2 არქიტექტურული აზომვითი სამუშაოების განხორციელება	1 wk	Fri 15-08-14	Thu 21-08-14
26	2.5.3 საინჟინრო სისტემების შესწავლა	1 wk	Fri 15-08-14	Thu 21-08-14
27	2.6 პირველადი ტენდერული დაგეგმვების გარდაქმნა ტენდერულ დაგეგმვად	2 days	Wed 20-08-14	Thu 21-08-14
28	2.7 ტენდერული დაგეგმვების მიმიხილება	1 day	Fri 22-08-14	Fri 22-08-14
29	2.8 ტენდერული დაგეგმვების დამტკიცება	1 day	Mon 25-08-14	Mon 25-08-14
30	**3 ფაზა C - კონცეპტუალური დაგეგმვა**	**21.5 days**	**Thu 21-08-14**	**Fri 19-09-14**
31	3.1 რისკების რეგისტრის შექმნა	5 days	Tue 26-08-14	Mon 01-09-14
32	3.2 პროექტის აღსრულების გეგმის რამოცალინება	2 wks	Tue 02-09-14	Mon 15-09-14
33	3.3 პროექტის აღსრულების გეგმის მიმიხილება	2 days	Tue 16-09-14	Wed 17-09-14
34	3.4 პროექტის აღსრულების გეგმის დამტკიცება	2 days	Thu 18-09-14	Fri 19-09-14
35	3.5 შეფასდეს და გაკონტროლდეს ყველა პოტენციური ან დამტკიცებული ცვლილება პროექტში	1 wk	Tue 26-08-14	Mon 01-09-14
36	3.6 ფაზა C-ს ხარჯების გეგმა შენობის ელემენტების მიხედვით	1.5 wks	Thu 21-08-14	Mon 01-09-14
37	3.7 კონცეპტუალური გადაწყვეტის განვითარება	1 wk	Tue 26-08-14	Mon 01-09-14
38	3.8 ნებართვების მოპოვების სტრატეგიის შეფასება	1 wk	Tue 26-08-14	Mon 01-09-14
39	3.9 კონცეპტუალური გადაწყვეტის მიმიხილება	2 days	Thu 28-08-14	Fri 29-08-14
40	3.10 კონცეპტუალური გადაწყვეტის დამოწმება	1 day	Fri 29-08-14	Fri 29-08-14
41	**4 ფაზა D - "პროექტი" დიზაინის განვითარება**	**15 days**	**Mon 01-09-14**	**Fri 19-09-14**
42	4.1 რისკების რეგისტრის განახლება	3 days	Mon 08-09-14	Thu 11-09-14
43	4.2 ღირებულებების ინჟინერია "Value Engineering"	3 wks	Mon 01-09-14	Fri 19-09-14
44	4.3 პროექტის აღსრულების გეგმის განახლება	1 wk	Thu 04-09-14	Thu 11-09-14
45	4.4 პროექტის მიღება-ჩაბარების კრიტერიუმების დადგენა	1 wk	Thu 04-09-14	Thu 11-09-14
46	4.5 შესყიდვების სტრატეგიის განვითარება	1 wk	Mon 01-09-14	Fri 05-09-14
47	4.6 შესყიდვების სტრატეგიის მიმიხილება	1 day	Mon 08-09-14	Mon 08-09-14
48	4.7 შესყიდვების სტრატეგიის დამტკიცება	1 day	Wed 10-09-14	Thu 11-09-14
49	4.8 პროექტის შემდეგ, სავფხურამდე განვითარება, სტადია "პროექტამდე" მიყვანა	1.5 wks	Mon 01-09-14	Wed 10-09-14
50	4.9 სტადია "პროექტის" მიმიხილება	2 days	Tue 09-09-14	Thu 11-09-14
51	4.10 სტადია "პროექტის" განახლება და დამტკიცება	1 day	Wed 10-09-14	Thu 11-09-14
52	4.11 მშენებლობის და სხვა საჭირო ნებართვების მოპოვება	1 wk	Thu 11-09-14	Thu 18-09-14
53	**5 ფაზა E და F1 - მუშა პროექტი და პროდუქციის ინფორმაცია**	**15 days**	**Thu 11-09-14**	**Thu 02-10-14**
54	5.1 რისკების რეგისტრის განახლება	3 days	Mon 22-09-14	Thu 25-09-14
55	5.2 ღირებულებების ინჟინერია "Value Engineering"	3 wks	Thu 11-09-14	Thu 02-10-14
56	5.3 პროექტის მიღება-ჩაბარების კრიტერიუმების გამოქვეყნება	1 wk	Thu 18-09-14	Thu 25-09-14
57	5.4 საცენდერო დოკუმენტაციის მომზადება	2 wks	Thu 18-09-14	Thu 02-10-14
58	5.5 მუშა დოკუმენტაციის და პროდუქციის ინფორმაციის მომზადება	2 wks	Thu 11-09-14	Thu 25-09-14
59	5.6 მუშა დოკუმენტაციის და პროდუქციის ინფორმაციის მიმიხილება	3 days	Mon 22-09-14	Thu 25-09-14
60	5.7 მუშა დოკუმენტაციის და პროდუქციის ინფორმაციის განახლება და დამტკიცება	1 day	Wed 24-09-14	Thu 25-09-14
61	**6 ფაზა G და H -ტენდერის დოკუმენტაცია და ტენდერი**	**26 days**	**Thu 25-09-14**	**Fri 31-10-14**
62	6.1 რისკების რეგისტრის განახლება	3 days	Thu 25-09-14	Tue 30-09-14
63	6.2 პროექტის აღსრულების გეგმის განახლება	1 wk	Thu 25-09-14	Thu 02-10-14
64	6.3 დეტალური მიღება-ჩაბარების კრიტერიუმების შედგენა	1 wk	Thu 25-09-14	Thu 02-10-14
65	6.4 ტენდერის გამოქვეყნება და საცენდერო წინადადებების მიღება	2.3 wks	Thu 02-10-14	Fri 17-10-14
66	6.5 ტენდერის შეფასება და რეკომენდაციის გაცემა დამკვეთზე	1.5 wks	Mon 20-10-14	Wed 29-10-14
67	6.6 სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის მომზადება	1 day	Wed 29-10-14	Thu 30-10-14
68	6.7 კონტრაქტორების დანიშვნა	1 day	Thu 30-10-14	Fri 31-10-14
69	**7 ფაზა F2 პროდუქციის ინფორმაცია**	**11 days**	**Fri 31-10-14**	**Mon 17-11-14**
70	7.1 კონტრაქტორის მიერ ქვეკონტრაქტორების დანიშვნა	1 wk	Fri 31-10-14	Fri 07-11-14
71	7.2 პროდუქციის ინფორმაციის წარმოება	1 wk	Fri 31-10-14	Fri 07-11-14
72	7.3 პროდუქციის ინფორმაციის მიმიხილება	2 days	Wed 12-11-14	Fri 14-11-14
73	7.4 პროდუქციის ინფორმაციის დამტკიცება	1 day	Fri 14-11-14	Mon 17-11-14
74	**8 ფაზა J+K მშენებლობა**	**40 days**	**Fri 31-10-14**	**Fri 26-12-14**
75	8.1 მშენებლობა პრაქტიკულ დასრულებამდე	2 mons	Fri 31-10-14	Fri 26-12-14
76	**9 ფაზა L ექსპლუატაციაში მიღება**	**23.5 days**	**Fri 28-11-14**	**Wed 31-12-14**
77	9.1 საბოლოო ინსპექციის განხორციელება	4.7 wks	Fri 28-11-14	Wed 31-12-14
78	9.2 დეფექტების აღმოფხვრის მონიტორინგი	4.7 wks	Fri 28-11-14	Wed 31-12-14
79	9.3 საბოლოო ხარჯების ანალიზი	4.7 wks	Fri 28-11-14	Wed 31-12-14
80	9.4 საბოლოო სახელშეკრულებო ანგარიშწორება	4.7 wks	Fri 28-11-14	Wed 31-12-14

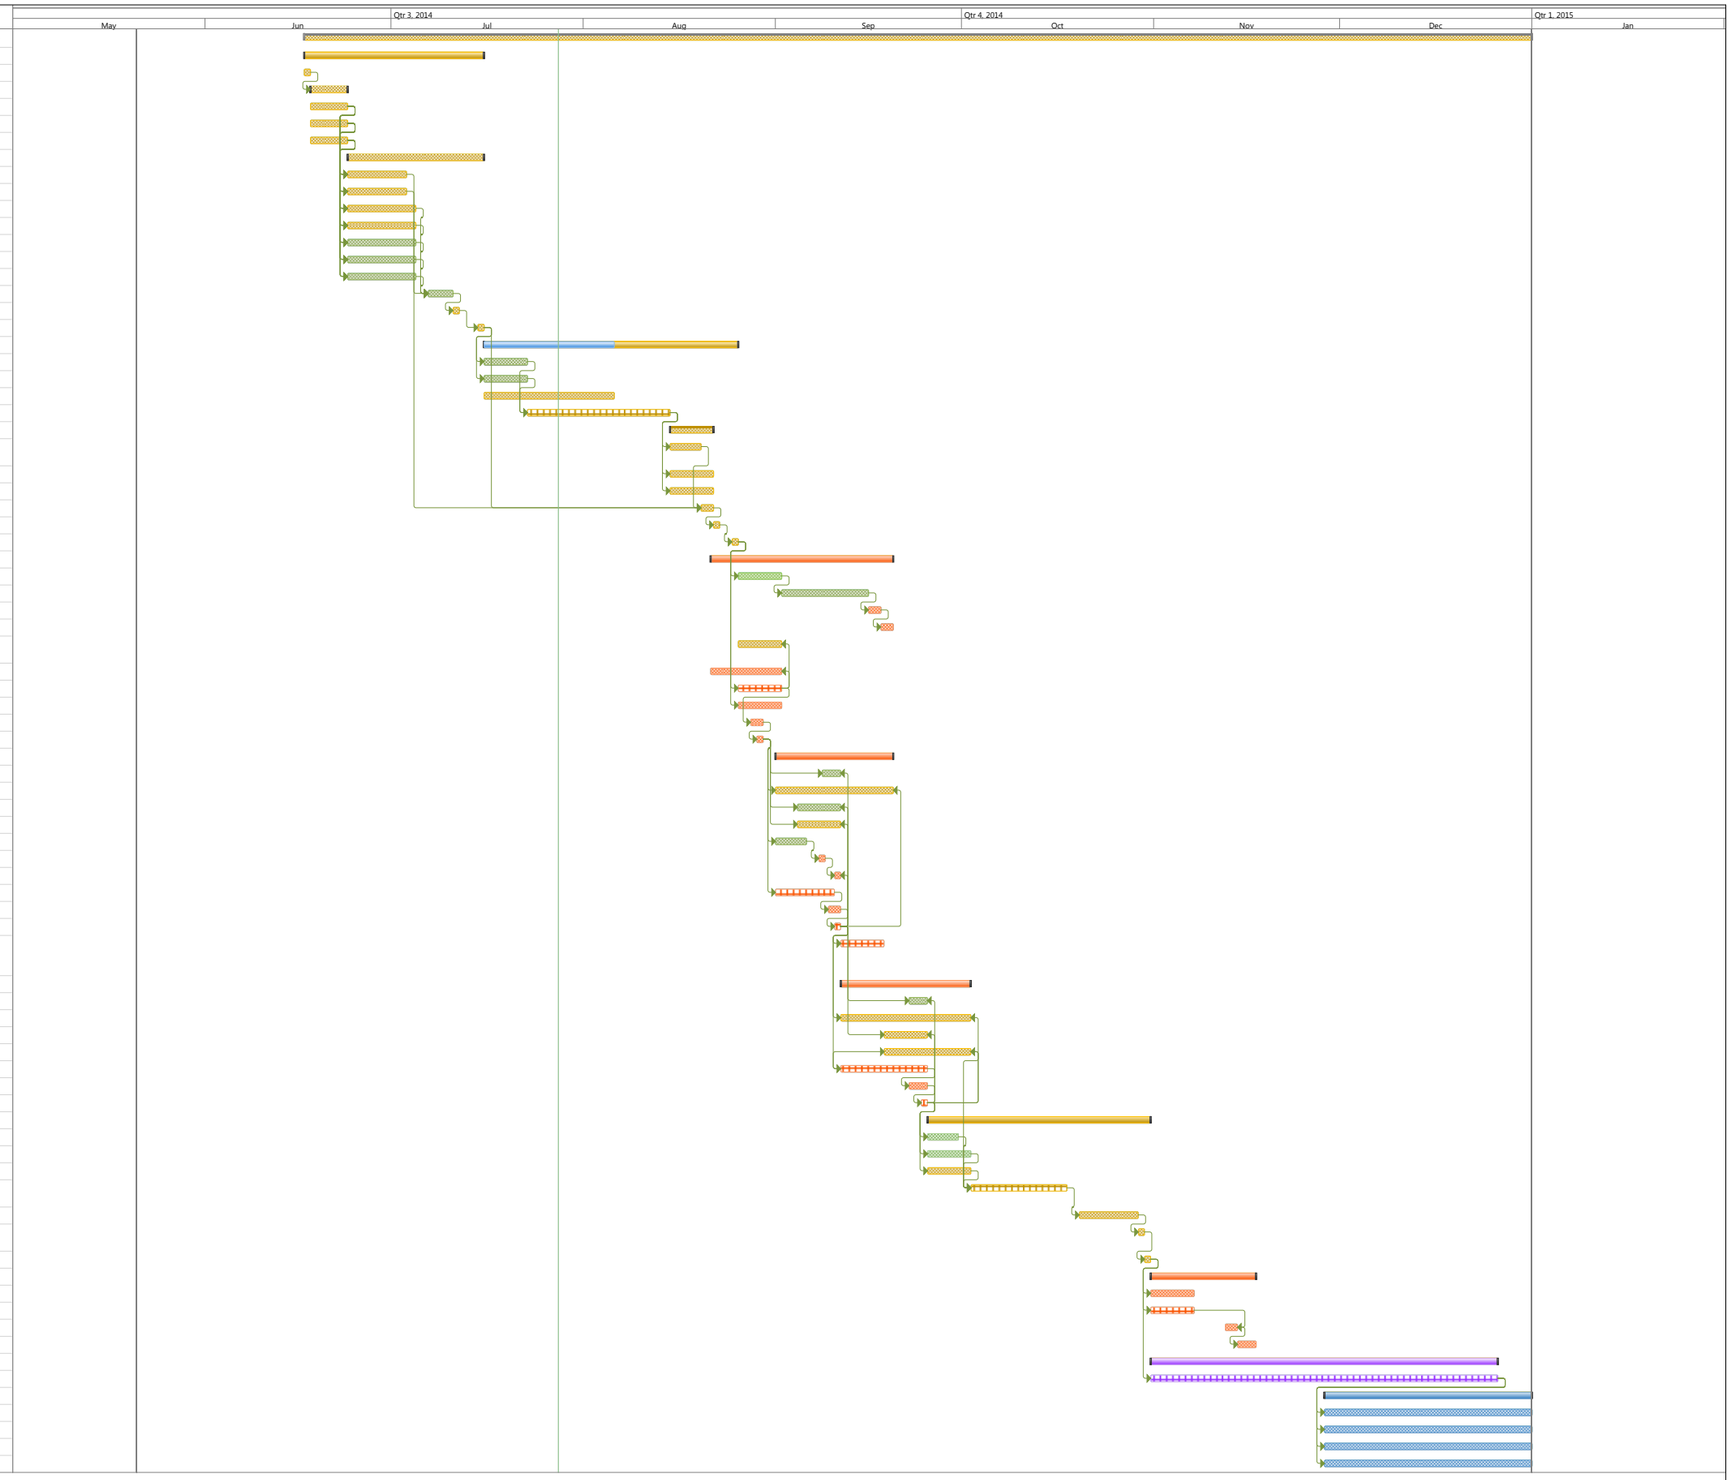

Project: 2013005TPA
Date: Mon 28-07-14
Rev: 4.0 Doc Status: Released

PM Tasks | Preparation Tasks | Milestone | Project Summary | Inactive Milestone | Manual Task | Manual Summary Rollup | Start-only | External Tasks | Deadline | Manual Progress
Task | Split | Summary | Inactive Task | Inactive Summary | Duration-only | Manual Summary | Finish-only | External Milestone | Progress

LMC Ltd 2013
