დანართი ბ - სტრატეგიული კალენდარული გრაფიკი

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1			**1 ფაზა A - შეფასება**	**38 days**	**11/06/13**	**01/08/13**
2			1.1 პროექტის შენეჯერ-კოორდინატორის დანიშვნა	0 days	11/06/13	11/06/13
3			**1.2 დამკვეთის მოთხოვნების იდენტიფიკაცია**	**15 days**	**11/06/13**	**01/07/13**
4	✓		1.2.1 ფინანსური მოთხოვნები	2 wks	11/06/13	24/06/13
5	✓		1.2.2 ვადებთან დაკავშირებული მოთხოვნები	2 wks	11/06/13	24/06/13
6	✓		1.2.3 სამუშაო მოცულობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები	10 days	11/06/13	24/06/13
7			**1.2.4 შენობის ფუნქციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები**	**15 days**	**11/06/13**	**01/07/13**
8			1.2.4.1 საოფისე ფართების ფუნქცია	3 wks	11/06/13	01/07/13
9			1.2.4.2 ლაბორატორიული ფართების ფუნქცია	3 wks	11/06/13	01/07/13
10	✓		1.3 შესყიდვების მეთოდის იდენტიფიკაცია	3 wks	25/06/13	15/07/13
11	✓		1.4 პროცედურების იდენტიფიკაცია	15 days	25/06/13	15/07/13
12	✓		1.5 ორგანიზაციული სტრუქტურის განსაზღვრა	15 days	25/06/13	15/07/13
13	✓		1.6 სტრატეგიული კალენდარული გრაფიკის განვითარება	15 days	25/06/13	15/07/13
14	✓		1.7 ხარჯების შეფასების პირველადი ვერსიის მოშზადება	15 days	25/06/13	15/07/13
15	✓		1.8 ზოგადი რისკების იდენტიფიკაცია	15 days	25/06/13	15/07/13
16	✓		1.9 პროექტის მოკლე აღწერილობის(პროექტის წესდების) მოშზადება	1 wk	16/07/13	22/07/13
17			1.10 პროექტის მოკლე აღწერილობის მიმოხილვა	1 wk	23/07/13	29/07/13
18			1.11 პროექტის მოკლე აღწერილობის დამოწმება	0 days	01/08/13	01/08/13
19			**2 ფაზა B - ტექნიკური დავალება**	**49 days**	**01/08/13**	**08/10/13**
20			2.1 პროექტის მოკლე აღწერილობის გარდაქმნა პირველად ტექნიკურ დავალებად	1 wk	02/08/13	08/08/13
21			2.2 შესყიდვების სტრატეგიის პირველადი ვერსიის განვითარება	1 wk	02/08/13	08/08/13
22			2.3 შენობის ფაქტიბრივი მდგომარეობის კვლევის განხორციელება	4 wks	01/08/13	28/08/13
23			2.4 საპროექტო გუნდის შერჩევა	3.4 wks	23/08/13	16/09/13
24			**2.5 შენობის პირველადი კვლევები და დათვალიერება**	**10 days**	**17/09/13**	**30/09/13**
25			2.5.1 საარქივო და სხვა ტიპის ნახაზების შესწავლა და შეფასება	1 wk	17/09/13	23/09/13
26			2.5.2 არქიტექტურული აზომვითი სამუშაოების განხორციელება	2 wks	17/09/13	30/09/13
27			2.5.3 საინჟინრო სისტემების შესწავლა	2 wks	17/09/13	30/09/13
28			2.6 პირველადი ტექნიკური დავალების გარდაქმნა ტექნიკურ დავალებად	1 wk	24/09/13	30/09/13
29			2.7 ტექნიკური დავალების მიმოხილვა	3 days	01/10/13	03/10/13
30			2.8 ტექნიკური დავალების დამტკიცება	0 days	08/10/13	08/10/13
31			**3 ფაზა C - კონცეპტუალური დიზაინი**	**18 days**	**09/10/13**	**01/11/13**
32			3.1 რისკების რეესტრის დადგენა	3 days	09/10/13	11/10/13
33			3.2 პროექტის აღსრულების გეგმის ჩამოყალიბება	2 wks	14/10/13	25/10/13
34			3.3 პროექტის აღსრულების გეგმის მიმოხილვა	3 days	28/10/13	30/10/13
35			3.4 პროექტის აღსრულების გეგმის დამტკიცება	2 days	31/10/13	01/11/13
36			3.5 შეფასდეს და გაკონტროლდეს ყველა პოტენციური ან დამტკიცებული ცვლილება პროექტში	1 wk	16/10/13	22/10/13
37			3.6 ფაზა C-ს ხარჯების გეგმა შენობის ელემენტების მიხედვით	2 wks	09/10/13	22/10/13
38			3.7 კონცეპტუალური გადაწყვეტის განვითარება	2 wks	09/10/13	22/10/13
39			3.8 ნებართვების მოპოვების სტრატეგიის შემუშავება	1 wk	09/10/13	15/10/13
40			3.9 კონცეპტუალური გადაწყვეტის მიმოხილვა	1 wk	16/10/13	22/10/13
41			3.10 კონცეპტუალური გადაწყვეტის დამოწმება	1 wk	18/10/13	24/10/13
42			**4 ფაზა D - "პროექტი" დიზაინის განვითარება**	**25 days**	**25/10/13**	**28/11/13**
43			4.1 რისკების რეესტრის განახლება	1 wk	19/11/13	25/11/13
44			4.2 ღირებულებების ინჟინერია "Value Engineering"	3 wks	05/11/13	25/11/13
45			4.3 პროექტის აღსრულების გეგმის განახლება	1 wk	19/11/13	25/11/13
46			4.4 პროექტის მიღება-ჩაბარების კრიტერიუმების დადგენა	1 wk	19/11/13	25/11/13
47			4.5 შესყიდვების სტრატეგიის განვითარება	2 wks	25/10/13	07/11/13
48			4.6 შესყიდვების სტრატეგიის მიმოხილვა	1 wk	08/11/13	14/11/13
49			4.7 შესყიდვების სტრატეგიის დამტკიცება	3 days	21/11/13	25/11/13
50			4.8 პროექტის შემდეგ სადეტურამდე განვითარება, სტადია "პროექტამდე" მიყვანა	3 wks	25/10/13	14/11/13
51			4.9 სტადია "პროექტის" მიმოხილვა	2 wks	08/11/13	21/11/13
52			4.10 სტადია "პროექტის" დამტკიცება	1 wk	19/11/13	25/11/13
53			4.11 მშენებლობის და სხვა საჭირო ნებართვების მოპოვება	3 days	26/11/13	28/11/13
54			**5 ფაზა E და F1 - მუშა პროექტი და პროდუქციის ინფორმაცია**	**32 days**	**26/11/13**	**17/01/14**
55			5.1 რისკების რეესტრის განახლება	1 wk	26/12/13	10/01/14
56			5.2 ღირებულებების ინჟინერია "Value Engineering"	3 wks	12/12/13	10/01/14
57			5.3 პროექტის მიღება-ჩაბარების კრიტერიუმების გამოქვეყნება	1 wk	26/12/13	10/01/14
58			5.4 სატენდერო დოკუმენტაციის მოშზადება	4 wks	12/12/13	17/01/14
59			5.5 მუშა დოკუმენტაციის და პროდუქციის ინფორმაციის მოშზადება	4 wks	26/11/13	23/12/13
60			5.6 მუშა დოკუმენტაციის და პროდუქციის ინფორმაციის მიმოხილვა	2 wks	17/12/13	30/12/13
61			5.7 მუშა დოკუმენტაციის და პროდუქციის ინფორმაციის განახლება და დამტკიცება	1 wk	26/12/13	10/01/14
62			**6 ფაზა G და H - ტენდერის დოკუმენტაცია და ტენდერი**	**25 days**	**13/01/14**	**14/02/14**
63			6.1 რისკების რეესტრის განახლება	1 wk	13/01/14	17/01/14
64			6.2 პროექტის აღსრულების გეგმის განახლება	1 wk	13/01/14	17/01/14
65			6.3 დეტალური მიღება-ჩაბარების კრიტერიუმების შედგენა	1 wk	13/01/14	17/01/14
66			6.4 ტენდერის გამოქვეყნება	2 wks	20/01/14	31/01/14
67			6.5 ტენდერის შეფასება და რეკომენდაციის გაცემა დამკვეთზე	1 wk	03/02/14	07/02/14
68			6.6 სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის მოშზადება	1 wk	10/02/14	14/02/14
69			6.7 კონტრაქტორების დანიშვნა	0 wks	14/02/14	14/02/14
70			**7 ფაზა F2 პროდუქციის ინფორმაცია**	**23 days**	**17/02/14**	**19/03/14**
71			7.1 კონტრაქტორის მიერ ქვეკონტრაქტორების დანიშვნა	2 wks	17/02/14	28/02/14
72			7.2 პროდუქციის ინფორმაციის წარმოება	3 wks	17/02/14	07/03/14
73			7.3 პროდუქციის ინფორმაციის მიმოხილვა	2 wks	03/03/14	14/03/14
74			7.4 პროდუქციის ინფორმაციის დამტკიცება	3 days	17/03/14	19/03/14
75			**8 ფაზა J+K მშენებლობა**	**100 days**	**24/02/14**	**11/07/14**
76			8.1 მშენებლობა პრაქტიკულ დასრულებამდე	5 mons	24/02/14	11/07/14
77			**9 ფაზა L ექსპლუატაციაში მიღება**	**40 days**	**16/06/14**	**08/08/14**
78			9.1 საბოლოო ინსპექციის განხორციელება	2 mons	16/06/14	08/08/14
79			9.2 დეფექტების აღმოფხვრის მონიტორინგი	2 mons	16/06/14	08/08/14
80			9.3 საბოლოო ხარჯების ანალიზი	2 mons	16/06/14	08/08/14
81			9.4 საბოლოო სახელშეკრულებო ანგარიშსწორება	2 mons	16/06/14	08/08/14
82			**10 300,000.00 ლარის სპეციალიზების შესრულება**	**43 days**	**31/10/13**	**30/12/13**
83			10.1 ფაზა C+D+E+F+G+H დასრულება	0 days	31/10/13	31/10/13
84			10.2 ფაზა J+K დასრულება	0 days	30/12/13	30/12/13

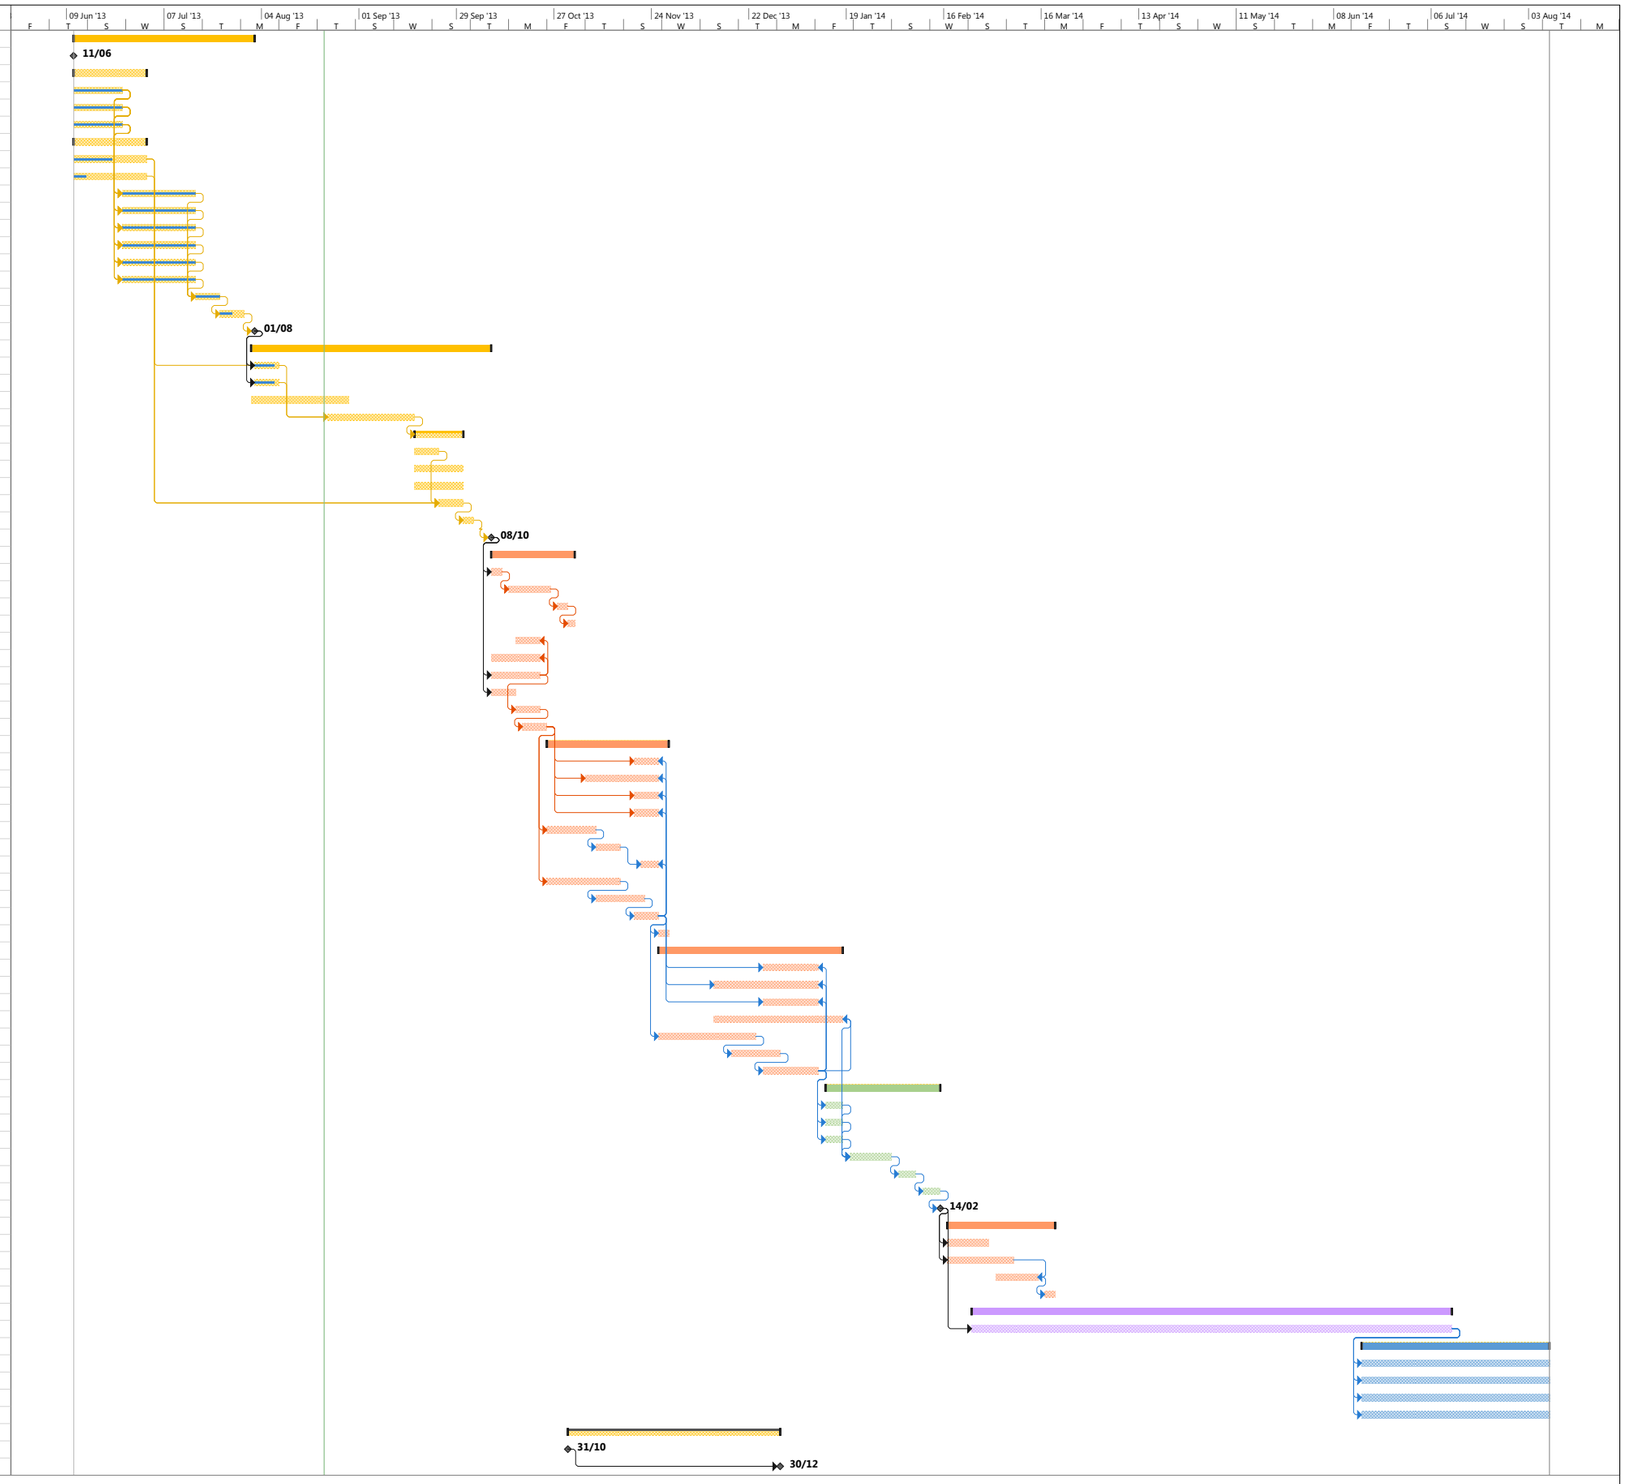

Project: 20130815-2013003STM

Task | Split | Summary | Inactive Task | Inactive Summary | Duration-only | Manual Summary | Finish-only | External Milestone | Progress
Preparation Tasks | Milestone | Project Summary | Inactive Milestone | Manual Task | Manual Summary Rollup | Start-only | External Tasks | Deadline | Manual Progress
